




Fédération des municipalités du Kesrouan - Ftouh

Accord de coopération décentralisée
avec le Département des Yvelines

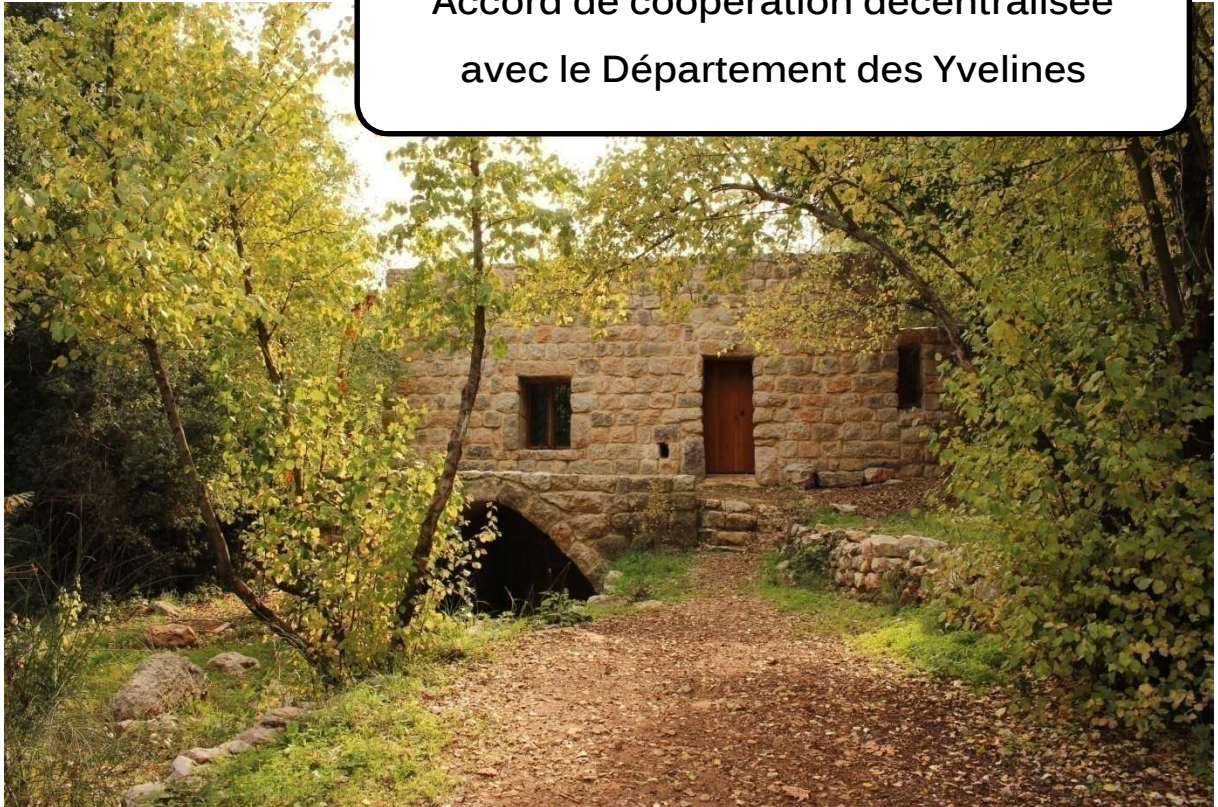

Rapport narratif et financier final

2014

En partenariat avec le Département des Yvelines



Yvelines
Conseil général

SOMMAIRE

CADRE CONVENTIONNEL	4
MOT DU PRESIDENT	5
RAPPORT NARRATIF	6
OBJECTIFS PREVISIONNELS	6
<i>Résumé bilan 2012.</i>	<i>6</i>
<i>Résumé objectifs 2013.</i>	<i>6</i>
<i>Budget prévisionnel.</i>	<i>7</i>
DEROULEMENT	8
<i>Programme 1 : Maison régionale du tourisme.</i>	<i>8</i>
<i>Programme 2 : aménagement de sentiers de randonnée.</i>	<i>9</i>
<i>Programme 3 : valorisation de la vallée Wadi-el-Salib.</i>	<i>10</i>
<i>Indicateurs chiffrés de résultat.</i>	<i>11</i>
<i>Indicateurs d'impact.</i>	<i>11</i>
<i>Appréciation de l'exécution.</i>	<i>11</i>
PERSECTIVES	12
<i>Orientations des programmes pour 2014.</i>	<i>12</i>
<i>Voies d'amélioration de la coopération.</i>	<i>12</i>
RAPPORT FINANCIER	13
TABLEAU D'ENSEMBLE	13
REPORTS ET RELIQUATS	13
TABLEAUX PAR CONVENTIONS	13
TABLEAUX PAR PROGRAMMES.	14
LISTE DES DEPENSES.	16
ANNEXES	16
<i>Annexe 1 – Justificatifs comptables.</i>	<i>18</i>
<i>Annexe 2- Etudes, rapports, comptes-rendus et procès-verbaux.</i>	<i>18</i>
<i>Annexe 3- Compte clos de l'exercice 2013.</i>	<i>18</i>
<i>Annexe 4- Budget prévisionnel 2014.</i>	<i>Erreur ! Signet non défini.</i>

CADRE CONVENTIONNEL

L'accord de coopération décentralisée a été signé le 13 juin 2013 et couvre la période 2013-2015. Trois domaines ont été identifiés par les partenaires :

- le renforcement institutionnel (renforcement des capacités techniques administratives et financière des personnels communaux) ;
- le développement économique ;
- la valorisation du patrimoine culturel et de l'éco-tourisme.

En 2014, une convention a été conclue par les partenaires la convention 2014-1 signée le 7 juillet 2014. Cette convention s'est déroulée en parallèle de la convention 2013-1 signée le 10 octobre 2013 portant sur le programme « Développement du Tourisme durable dans la Vallée Wadi-el-Salib ». Ce projet associe également l'Association des amis d'Abraham Ecchellensis (France), le Comité départemental de la randonnée pédestre et Yvelines Tourisme.

Les actions principales prévues par les deux conventions concernaient principalement :

- L'attractivité touristique du Kesrouan-Ftough via trois projets :
 - La mise en place d'une Maison régionale du tourisme pour le Kesrouan-Ftough ;
 - La réalisation d'un recensement de l'offre touristique et d'une étude du marché du tourisme sur le territoire du Kesrouan-Ftough ;
 - La réalisation d'outils de communication (site Internet, brochures...)
- L'accompagnement du projet « Vie à l'Ancienne » : recours aux experts au niveau des actions suivantes : appui à la formation des guides de randonnées et aux techniques et méthodes de balisage.
- La poursuite de l'aménagement du sentier de randonnée dit « Sentier des sources » à Kfour.

MOT DU PRESIDENT

Nous avons pu, au terme de l'année 2014, célébrer la réalisation du Sentier de la Lune, du Sentier des Sources et de la Vie à l'Ancienne qui, actuellement, en pleine phase d'ameublement, dernier passage obligé avant de les ouvrir au grand public. Le Sentier des Sources et la Vie à l'Ancienne fêteront leur inauguration officielle en mai prochain, en présence de Monsieur Pierre Bédier, Président du Département des Yvelines, le généreux partenaire de la Fédération des municipalités du Kesrouan-Ftough.

Grâce à notre coopération avec les Yvelines, ces projets bénéficieront d'une visibilité locale et internationale via la publication de brochures et leur mention sur notre site d'éco-tourisme. Quant à Kfour, le village pourra développer une troisième phase de son Sentier en été 2015.

Nous réaffirmons les liens d'amitié qui nous unissent au département des Yvelines qui a toujours fait preuve d'un soutien exceptionnel et nous espérons que ces projets, lors de leur ouverture au public, seront à la hauteur des espérances et des efforts mutuels déployés.

Nouhad NAUFAL,

Président de la Fédération des municipalités du Kesrouan-Ftough

RAPPORT NARRATIF

La période couverte par le rapport narratif s'étend du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2014.

OBJECTIFS PREVISIONNELS

Résumé bilan 2013

En 2013, trois programmes ont été conduits :

- L'aménagement du sentier des Sources (phase 2) : La mise en place du 2e chantier des jeunes au cours de l'été 2014 : dans la suite du succès du premier chantier des jeunes constitué essentiellement de jeunes yvelinois, la Fédération a fait appel aux jeunes scouts libanais pour participer au 2e chantier, se voyant dans l'incapacité d'accueillir de jeunes yvelinois de nouveau, et ce pour de multiples raisons la finalisation de la phase 2 : ajout des balustrades et des aires de repos ;
- La valorisation de la vallée Wadi-el-Salib : Les 4 composantes, citées dans la convention, ont finalisées dans le but de terminer les travaux avant l'inauguration prévue en mai 2015 :
 - La mise en place du point d'information touristique à Rayfoun (cf. Composante 1)
 - L'aménagement des gîtes : l'assainissement des eaux usées, l'accès à l'eau potable et à l'alimentation, l'équipement en énergie solaire, l'installation électrique et, bientôt, l'ameublement
 - L'offre de randonnée : une brochure est en cours de préparation
 - La communication/évaluation : une étude budgétaire détaillée sera communiquée début juin 2015.

Résumé objectifs 2014

L'année 2014 était structurée autour de trois programmes : l'accompagnement de la Maison régionale du tourisme, les chantiers jeunes pour l'aménagement de circuits de randonnées, et la valorisation de la vallée Wadi-el-Salib dans le cadre de la continuation du projet « Vie à l'ancienne ».

Concernant le premier programme, les conventions prévoyaient la participation de la Maison régionale du Tourisme à plusieurs évènements locaux, en vue d'assurer la promotion touristique de la région (« Les nuits du vieux souk » à Zouk Mikail et les « Kfouriates » à Kfour) ; la poursuite de la préparation du site internet touristique de la Fédération (« Tourism in Kesrwan ») ; la réalisation d'un Schéma directeur des randonnées pédestres de la Fédération, identifiant les sentiers existants et les sentiers qu'il conviendrait d'aménager en vue de donner une cohérence aux itinéraires ainsi qu'une Charte d'aménagement des sentiers assurant leur harmonisation.

Les actions en matière d'aménagement de sentiers portaient sur la finalisation de la phase 1 du « Sentier des sources » à Kfour, qui avait fait l'objet d'un chantier jeunes international durant l'été 2013, et la mise en chantier d'une seconde phase d'aménagement, s'appuyant également sur un chantier international de jeunes.

Enfin, le programme « Vie à l'ancienne » devait conduire à finaliser les travaux dans les gîtes d'étapes de la vallée Wadi-el-Salib, de procéder à l'ameublement de ces gîtes ainsi que de l'office local du tourisme à Rayfoun, de finaliser l'étude des potentialités touristiques de la vallée commandée à une consultante locale, et d'achever les topoguides de randonnées dans la vallée suite à la mission du Codérando78 en novembre 2013.

Budget prévisionnel.

DEPENSES		Euros	Local	RECETTES		Euros	Local
Maison régionale du tourisme	40 700,00 €	78 525 717	Fédération des municipalités du Kesrouan-Ftuh	17 700,23 €	34 150 448		
Aménagement de sentiers	42 856,33 €	82 686 094	Département des Yvelines	172416,10 €	332 655 966		
Vie à l'ancienne	106 560,00 €	205 594 604	Municipalité de Kfour	- €	-		
TOTAL	190 116,33 €	366 806 415	TOTAL	190 116,33 €	366 806 415		

DEROULEMENT

Programme 1 : Maison régionale du tourisme.

- Activité 1 : Construction du site internet.

Le site internet du tourisme au Kesrouan n'est pas achevé et devrait être lancé par la société Softimpact au cours du deuxième trimestre 2015. Le retard du lancement est dû au retard dans la réception de l'étude menée par Berthe Abou Jaoudé, qui a été désignée par l'association Abraham. Cette étude s'est avérée insuffisante et pauvre en informations utiles.

Le site internet, comme exposé dans le rapport précédent, sera disponible en français et en anglais, et permettra aux visiteurs de consulter les actualités touristiques (activités, festivités, etc.) de la fédération. Il sera doté d'un moteur de recherche – outil nécessaire pour tout visiteur et touriste – en mesure de renseigner le visiteur à propos des hôtels, des compagnies de location de voitures, des services de restauration, etc.10



La page d'accueil du site « Tourism in Kesrouan »

- Activité 2 : Valorisation touristique du Kesrouan.

La MRT a participé via un stand promoteur durant les Soirées de vieux souk à Zouk Mikael, pour promouvoir les produits locaux, en juillet 2014. Ce stand a été animé pendant 10 jours par deux hôtesse et le responsable de la MRT. La MRT a aussi apporté une contribution financière à l'organisation de ce festival.



Le stand de la MRT lors des Soirées du vieux souk

Par ailleurs, à la demande du Président de la Fédération, la MRT a travaillé à la préparation d'un livre de promotion touristique du Kesrouan-Ftouh. Cette activité, initialement non prévue, doit remplacer l'édition de la brochure qui devait être spécifiquement éditée pour la promotion de la vallée Wadi-el-Salib.

- **Activité 3 : Mise à jour de la gouvernance et du statut de la Maison régionale du tourisme.**

Il avait été suggéré de réévaluer le statut et la gouvernance de la MRT en vue d'en faire un outil de concertation territoriale doté d'une relative autonomie juridique et financière. Des recherches de nature juridique devaient être entreprises pour évaluer dans quelle mesure un schéma de type associatif pourrait être valable dans le contexte du Liban. Le statut associatif permettrait de faire participer les acteurs économiques à la gouvernance de la MRT (concertation public-privé) et de recueillir des ressources additionnelles.

A ce jour, ces recherches juridiques n'ont pas encore été concrétisées.

- **Activité 4 : Elaboration d'un schéma directeur de la randonnée pédestre.**

L'étude d'un schéma directeur de randonnée pédestre a été confiée au bureau d'études du Dr. Antoine Fischfisch qui avait déjà commencé à collecter les informations et les cartes nécessaires avec le soutien et la coopération de la Fédération. Cette étude s'étendra sur 8 mois et englobera toute la Fédération. L'étude devra être présentée en été 2015 et comprendra notamment : l'identification des sentiers existants, l'identification des sentiers à aménager dans le but de donner une cohérence globale à la randonnée pédestre dans le Kesrouan-Ftouh, et une charte définissant les règles en matière d'équipement et de signalisation communes à tous les sentiers de la Fédération.

Programme 2 : aménagement de sentiers de randonnée.

- **Activité 1 : Finalisation de la première tranche du Sentier des sources :**

La coordination technique du chantier est réalisée par la Fédération et la Mairie de Kfour qui a assuré l'organisation et le suivi du travail, et la distribution des sections entre les équipes des kesernois.

Des travaux de terrassement, de nettoyage des cours d'eau, de retapage et de réhabilitation des 4 sources ont été effectués afin d'améliorer le débit.



Une vue du Sentier des sources et des aménagements réalisés

- **Activité 2 : réalisation de la deuxième phase d'aménagement du Sentier des sources.**

La deuxième phase d'aménagement portait sur une section de 2,35 km. Comme chaque année, elle devait impliquer la participation de jeunes Yvelinois et de jeunes Kfourioties pour les opérations de débroussaillage et d'élagage. En vue d'approfondir les liens de la municipalité de Kfour avec le territoire yvelinois, le Département des Yvelines a entrepris de convaincre la Mairie de Marly-le-Roi de s'engager dans ce chantier, et de nouer ainsi officiellement des relations avec la Mairie de Kfour qui auraient pu ensuite conduire à un partenariat durable. Malheureusement, en raison des élections municipales en France, il a été difficile de mobiliser les élus de Marly-le-Roi, et la participation de jeunes de cette ville a été abandonnée en avril, ce qui rendait impossible la constitution d'une nouvelle équipe de jeunes des Yvelines. Pour cette raison, seuls des jeunes Libanais, principalement des groupes scouts (20 personnes), ont participé au chantier d'été.

Une partie des travaux s'est déroulée en été 2014. 36 500 € étaient affectés à ces travaux, qui ont consisté en la réalisation d'escaliers en pierre, la pose de plusieurs éléments mobiliers (tables, bancs...), le nettoyage et la reconstruction de 3 sources existant dans la vallée et l'édition d'une brochure touristique. Le coût final des travaux sera livré avant l'inauguration du Sentier qui aura lieu le 30 mai 2015.

Programme 3 : valorisation de la vallée Wadi-el-Salib.

- **Activité 1 : équipement des gîtes.**

La mise en place des branchements de l'eau, l'alimentation électrique, l'assainissement des eaux usées, ainsi que l'énergie solaire pour les chauffe-eau, a été réalisée durant l'année 2014. La suite des travaux est toujours en cours d'exécution, ainsi que l'équipement mobilier des gîtes.

- **Activité 2 : identification des potentialités touristiques de la vallée.**

Une étude a été commandée dans le cadre du partenariat avec l'Association des amis d'Abraham Ecchellensis. Cette étude a été réalisée par Mme Berthe Abou Jaoudé, avec l'aide et l'appui de la

Fédération. Le contrat a été signé le 10 octobre 2013 et l'étude a pu démarrer au mois de Janvier 2014. Elle a été présentée à la Fédération et au département des Yvelines en mai 2014. Cependant, cette étude a été jugée insuffisante et a été écartée.

- **Activité 3 : réalisation d'un topoguide des sentiers de la vallée.**

Une mission du Codérando78 a eu lieu entre le 7 et le 17 novembre 2013. Pour la bonne exécution de cette mission, la Fédération a fait l'acquisition d'un GPS et a recruté deux guides locaux pour accompagner les deux représentants du Codérando78. La mission a donné lieu à un rapport contenant le descriptif de 4 itinéraires de randonnées, choisis parmi les 13 pistes repérées avec les guides locaux. Les 4 itinéraires ont été traduits en fiche de randonnée, dont la mise en page et quelques compléments doivent être poursuivis par la Fédération.

Indicateurs chiffrés de résultat.

Indicateur	2013	2014
PROGRAMME 1 : Maison régionale du Tourisme		
Nombre de pages nouvelles ajoutées sur le site	0	7
Total des pages disponibles sur le site	0	7
PROGRAMME 2 : Sentiers de randonnée		
Nombre de jeunes yvelinois accueillis depuis 2011	18	18
Nombre de jeunes libanais participants depuis 2011	22	40
Longueur des sentiers aménagés depuis 2011	9,2km	23,5km
PROGRAMME 3 : Vallée Wadi-el-Salib		
Nombre de sentiers balisés dans la vallée	6	6
Nombre de visiteurs accueillis à Rayfoun	0	0

Indicateurs d'impact.

Indicateur	2013	2014
PROGRAMME 1 : Maison régionale du Tourisme		
Nombre de visiteurs sur le site cette année	0	0
PROGRAMME 2 : Sentiers de randonnée		
Nombre de sentiers aménagés	3	9
PROGRAMME 3 : Vallée Wadi-el-Salib		
Nombre de nuitées dans les gîtes	0	0

Appréciation de l'exécution.

- Les jeunes yvelinois n'ont pas pu participer au chantier des jeunes de 2014 dédié au Sentier des Sources. Ce fut une déception pour les jeunes kfouriotés qui attendaient avec impatience une occasion pour un échange culturel fructueux.
- Le rapport de Mme Berthe Abou Jaoudé n'a pas été aussi satisfaisant que prévu, constituant ainsi un obstacle à la rédaction des brochures touristiques.
- Les contrats de gérances seront signés avant l'inauguration en juin 2015.

Orientations des programmes pour 2015.

Dans le cadre de l'accompagnement de la Maison régionale du tourisme, la Fédération souhaite finaliser le schéma directeur d'aménagement touristique pour tout le territoire de la Fédération des Municipalités du Kesrouan-Ftouh.

Concernant l'aménagement des sentiers, la Fédération prévoit poursuivre l'exécution du Sentier des sources (3^e phase) qui unit les deux villes Kfour et Ghodras, dans le cadre d'un nouveau chantier de jeunes franco-libanais. Le programme prévisionnel du chantier devra être réalisé courant mars 2015 afin de pouvoir engager la nouvelle convention. La ville de Kfour souhaiterait par ailleurs que ce chantier de jeunes puisse être le support d'un rapprochement avec une ville yvelinoise, en vue d'un jumelage.

Dans le cadre de la valorisation de la vallée Wadi-el-Salib, la Fédération entend poursuivre le projet tel qu'il est défini dans le cadre de la convention 2014-1.

Voies d'amélioration de la coopération.

Pas d'amélioration à aborder

RAPPORT FINANCIER

La période couverte par le rapport narratif s'étend du 1^{er} janvier 2014 au 31 décembre 2014.

TABLEAU D'ENSEMBLE

DEPENSES	Prévisionnel	Réalisé	RECETTES	Prévisionnel	Réalisé
Maison régionale du tourisme	40 700,00 €	31 191,57 €	Compte coopération Yvelines-Kesrouan	- €	- 65 510,24 €
Aménagement de sentiers	42 856,33 €	19 178,24 €	Département des Yvelines	172 416,10 €	138 888,29 €
Vie à l'ancienne	106 559,77 €	34 410,90 €	Fédération des municipalités	17 700,00 €	11 402,66 €
TOTAL	190 116,10 €	84 780,71 €	TOTAL	190 116,10 €	84 780,71 €

DEPENSES	Prévisionnel	Réalisé	RECETTES	Prévisionnel	Réalisé
Maison régionale du tourisme	78 525 537	60 180 225	Compte coopération Yvelines-Kesrouan	-	- 126 393 787
Aménagement de sentiers	82 685 905	37 002 000	Département des Yvelines	332 655 205	267 967 512
Vie à l'ancienne	205 593 689	66 391 500	Fédération des municipalités	34 149 926	22 000 000
TOTAL	366 805 131	163 573 725	TOTAL	366 805 131	163 573 725

REPORTS ET RELIQUATS

DEPENSES	Euros	Local	RECETTES	Euros	Local
Déficit à régulariser	- €	-	Collectivité partenaire - Non versé à reporter	4 500,00 €	8 682 185
Dépenses restant à exécuter	- €	-	Collectivité partenaire - Autofinancement reporté exercice précédent	- €	-
			CG78 - Reliquat sur subvention versée	65 510,24 €	126393 787
			CG78 - Solde restant à verser	33 528,00 €	64 688 064
			Autres - Solde restant à percevoir	- €	-
TOTAL	- €	-	TOTAL	103 538,24 €	199 764 036

TABLEAUX PAR CONVENTIONS.

Convention	2014-1		En euros		
	Prévisionnel	Réalisé	RECETTES	Prévisionnel	Réalisé
Maison régionale du tourisme	40 700,00 €	31 191,57 €	Compte coopération Yvelines-Kesrouan	- €	- 18 589,18 €
Aménagement de sentiers	42 856,33 €	19 178,24 €	Département des Yvelines	70 356,33 €	57 556,34 €

Vie à l'ancienne	- €	- €	Fédération des municipalités du KesrouanFtouh	13 200,00 €	11 402,66 €
TOTAL	83 556,33 €	50 369,81 €	TOTAL	83 556,33 €	50 369,81 €

Convention	2013-1		En euros		
DEPENSES	Prévisionnel	Réalisé	RECETTES	Prévisionnel	Réalisé
Maison régionale du tourisme	- €	- €	Compte coopération Yvelines-Kesrouan	- €	- 46 921,06 €
Aménagement de sentiers	- €	- €	Département des Yvelines	10 259,77 €	81 331,96 €
Vie à l'ancienne	106 559,77 €	34 410,90 €	Fédération des municipalités du KesrouanFtouh	4 500,00 €	- €
TOTAL	106 559,77 €	34 410,90 €	TOTAL	106 559,77 €	34 410,90 €

TABLEAUX PAR PROGRAMMES.

Programme	Maison régionale du tourisme			
DEPENSES	Prévisionnel (euros)	Prévisionnel (local)	Réalisé (euros)	Réalisé (local)
Non affecté à une activité	- €	-	- €	-
Sentier des sources - Phase 1	- €	-	- €	-
Sentier des sources - Phase 2	- €	-	- €	-
Point d'information touristique	- €	-	- €	-
Offre de randonnée	- €	-	- €	-
Aménagement des gîtes	- €	-	- €	-
Communication/évaluation	- €	-	- €	-
Gouvernance MRT	- €	-	- €	-
Communication/événements	10 000,00 €	19 293 744	10 848,19 €	20 930 225
Charges générales MRT	13 200,00 €	25 467 742	11 402,66 €	22 000 000
Schéma directeur	17 500,00 €	33 764 052	8 940,72 €	17 250 000
TOTAL	40 700,00 €	78 525 537	31 191,57 €	60 180 225

Programme	Aménagement de sentiers			
DEPENSES	Prévisionnel (euros)	Prévisionnel (local)	Réalisé (euros)	Réalisé (local)
Non affecté à une activité	- €	-	- €	-
Sentier des sources - Phase 1	6 356,33 €	12 263 740	7 166,57 €	13 827 000
Sentier des sources - Phase 2	36 500,00 €	70 422 166	12 011,67 €	23 175 000
Point d'information touristique	- €	-	- €	-
Offre de randonnée	- €	-	- €	-
Aménagement des gîtes	- €	-	- €	-
Communication/évaluation	- €	-	- €	-

Gouvernance MRT	- €	-	- €	-
Communication/événements	- €	-	- €	-
Charges générales MRT	- €	-	- €	-
Schéma directeur	- €	-	- €	-
TOTAL	42 856,33 €	82 685 905	19 178,24 €	37 002 000

Programme Vie à l'ancienne				
DEPENSES	Prévisionnel (euros)	Prévisionnel (local)	Réalisé (euros)	Réalisé (local)
Non affecté à une activité	- €	-	- €	-
Sentier des sources - Phase 1	- €	-	- €	-
Sentier des sources - Phase 2	- €	-	- €	-
Point d'information touristique	28 800,00 €	55 565 982	- €	-
Offre de randonnée	8 420,00 €	16 245 332	2 048,85 €	3 953 000
Aménagement des gîtes	61 340,00 €	118 347 824	32 362,04 €	62 438 500
Communication/évaluation	7 999,77 €	15 434 551	- €	-
Gouvernance MRT	- €	-	- €	-
Communication/événements	- €	-	- €	-
Charges générales MRT	- €	-	- €	-
Schéma directeur	- €	-	- €	-
TOTAL	106 559,77 €	205 593 689	34 410,90 €	66 391 500

LISTE DES DEPENSES.

Programme 1 : Maison régionale du tourisme.

Description	Réf. Justificatif	Convention	Section	Activité	Montant (local)	Montant (euros)
visuel et roll up pour stand de la MRT	141-1	2014-1	Fonctionnement	Communication/événements	1 350 000	699,71 €
deux hotesses pour 10 jours	141-4	2014-1	Fonctionnement	Communication/événements	2 000 000	1 036,61 €
animation des nuits de vieux souk-zouk mikael	141-2	2014-1	Fonctionnement	Communication/événements	5 250 000	2 721,09 €
promotion des evenements locaux	141-3	2014-1	Fonctionnement	Communication/événements	6 330 225	3 280,97 €
Facture avance Dr Antoine Fischfisch	141-5	2014-1	Fonctionnement	Schéma directeur	17 250 000	8 940,72 €
Animation musicale Nuits du Vieux Souk	141-6	2014-1	Fonctionnement	Communication/événements	6 000 000	3 109,82 €
Salaire chargé de mission	141-7	2014-1	Fonctionnement	Charges générales MRT	22 000 000	11 402,66 €

Programme 2 : Aménagement de sentiers.

Description	Réf. Justificatif	Convention	Section	Activité	Montant (local)	Montant (euros)
Travaux sur chantier et signalisation	Kfour109	2014-1	Investissement	Sentier des sources - Phase 1	10 677 000	5 533,92 €
Equipements	Kfour110	2014-1	Investissement	Sentier des sources - Phase 1	3 150 000	1 632,65 €
Phase 2- Tables et bancs	Kfour1	2014-1	Investissement	Sentier des sources - Phase 2	6 000 000	3 109,82 €
Phase 2- Travaux ouvriers 1	Kfour2	2014-1	Investissement	Sentier des sources - Phase 2	2 300 000	1 192,10 €
Phase 2 - Travaux ouvriers 2	Kfour3	2014-1	Investissement	Sentier des sources - Phase 2	3 900 000	2 021,38 €
Phase 2 - Indemnité chef scout	Kfour4	2014-1	Fonctionnement	Sentier des sources - Phase 2	2 500 000	1 295,76 €
Phase 2- Restauration sur chantier	Kfour5	2014-1	Fonctionnement	Sentier des sources - Phase 2	1 135 000	588,27 €
Phase 2 - Transport des jeunes	Kfour6	2014-1	Fonctionnement	Sentier des sources - Phase 2	1 350 000	699,71 €
Phase 2 - Travail restauration sources	Kfour7	2014-1	Investissement	Sentier des sources - Phase 2	5 000 000	2 591,51 €
Phase 2 - Dîner des jeunes	Kfour8	2014-1	Fonctionnement	Sentier des sources - Phase 2	990 000	513,12 €

Programme 3 : Vie à l'ancienne

Description	Réf. Justificatif	Convention	Section	Activité	Montant (local)	Montant (euros)
Outils divers	VAA006	2013-1	Fonctionnement	Offre de randonnée	70 000	36,28 €
Cartes topographiques	VAA007	2013-1	Fonctionnement	Offre de randonnée	58 000	30,06 €
Travaux de topographie	VAA008	2013-1	Fonctionnement	Offre de randonnée	2 250 000	1 166,18 €
Travaux électriques	VAA009	2013-1	Investissement	Aménagement des	6 550 000	3 394,88 €

			nt	gites		
Accès à l'eau	VAA010	2013-1	Investisseme nt	Aménagement des gites	3 750 000	1 943,64 €
Appareil photo	VAA011	2013-1	Fonctionne ment	Offre de randonnée	1 575 000	816,33 €
Assainissement des eaux usées	VAA012	2013-1	Investisseme nt	Aménagement des gites	14 400 000	7 463,56 €
Connection des tuyaux d'assainissement	VAA013	2013-1	Investisseme nt	Aménagement des gites	7 500 000	3 887,27 €
Panneaux solaires 1	VAA014	2013-1	Investisseme nt	Aménagement des gites	2 374 500	1 230,71 €
Panneaux solaires 2	VAA015	2013-1	Investisseme nt	Aménagement des gites	4 749 000	2 461,42 €
Travaux sur gîtes	VAA016	2013-1	Investisseme nt	Aménagement des gites	6 000 000	3 109,82 €
Travaux de terrassement	VAA017	2013-1	Investisseme nt	Aménagement des gites	17 115 000	8 870,75 €

ANNEXES

Annexe 1 – Justificatifs comptables.

Cette annexe séparée réunit les copies des documents comptables sur la base desquels les dépenses ont été réalisées (factures d'acompte, de solde...). Elles sont classées par ordre des numéros de justificatifs.

Annexe 2- Etudes, rapports, comptes-rendus et procès-verbaux.

Cette annexe séparée réunit les études et rapports livrés par des prestataires dans le cadre de commandes, les comptes-rendus de réunion, les procès-verbaux de réception des travaux.

Annexe 3- Compte clos de l'exercice 2013.

Cette annexe séparée reproduit le compte clos de l'exercice terminé pour la collectivité partenaire. Il permet d'identifier les fonds reçus en provenance du Conseil général des Yvelines. Le compte est le compte général si les fonds sont affectés au budget général, ou le(s) compte(s) annexe(s) si les fonds sont affectés à un budget annexe. Il ne s'agit pas nécessairement d'un compte administratif certifié, il peut être établi par le comptable de la collectivité. Sa reproduction ne se substitue pas à la transmission du compte certifié, mesure prévue par les conventions avec le Département, qui peut intervenir plus tard.

Le présent rapport a été établi par la Fédération Kesrouan-Ftough. Les données qu'il contient sont réservées à l'information et à l'utilisation exclusive de Kesrouan-Ftough et du Département des Yvelines. La communication de ce rapport à des tiers est soumise à accord préalable des Présidents du Kesrouan-Ftough et du Département des Yvelines.

CONTACT

Fédération des Municipalités de Kesrouan-Ftough

Adresse : Rue palais municipal- Zouk Mikael - Liban

Site internet : www.tourism-kesrwan.org

Téléphone : 00961 9 212212

E-mail : info@tourism-kesrwan.org
